

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店新建、扩建 项目竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20191104001

项目名称： 东莞市虎门龙顺莹利五金加工店新建、扩建项目

建设单位： 东莞市虎门龙顺莹利五金加工店



东莞市华溯检测技术有限公司

二〇一九年十月

编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20191104003）检测报告。

建设单位：东莞市虎门龙顺莹利五金加工店

法人代表：熊海龙

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

法人代表：何春桥

项目负责人：庄佳喜

报告编写人：陈顺文

复核：龚路

审核：黄俊能

签发：郑世琪

签发日期：2019年11月04日

建设单位：东莞市虎门龙顺莹利五金加工店

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13829156825

电话：0769-27285578

传真：--

传真：0769-23116852

邮编：--

邮编：523129

地址：广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷4号301室

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	2
3.1 平面布置.....	3
3.2 建设内容.....	3
3.3 主要原辅材料.....	4
3.4 生产工艺.....	5
3.5 项目变动情况.....	5
4 环境保护设施.....	6
4.1 污染物治理/处置设施.....	6
4.1.1 废气.....	6
4.1.2 噪声.....	6
4.1.3 固（液）体废物.....	7
5 建设项目环评报告表审批部门审批决定.....	9
6 验收执行标准.....	9
6.1 废气验收执行标准.....	9
6.2 噪声验收执行标准.....	9
7 验收监测内容.....	10
8 质量保证及质量控制.....	10
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	10
8.2 人员资质.....	10
8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	11
8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	11
9 验收监测结果.....	12
9.1 监测期间天气情况.....	12
9.2 生产工况.....	12
9.3 环境保护设施调试效果.....	13
9.3.1 污染物排放监测结果.....	13
9.3.1.1 废气.....	13

9.3.1.2 厂界噪声.....	14
10 环保检查结果.....	14
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	14
10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	14
11 验收监测结论.....	15
11.1 废气.....	15
11.2 噪声.....	15
11.3 固体废弃物.....	15
11.4 建议.....	15
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	16
附件 1 监测人员上岗证.....	17
附件 2 采样照片.....	19
附件 3 审批部门审批决定.....	20
附件 4 验收监测委托书.....	26
附件 5 夜间不生产证明.....	27

1 验收项目概况

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店位于广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷 4 号 301 室。

新建项目《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 7 月 17 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕12062 号，项目主要加工生产五金零配件 3600 万个/年。项目总投资 30 万元，其中环保投资 6.5 万元，占地面积 100 平方米，建筑面积 100 平方米。

扩建项目《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 10 月 28 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕21830 号，现由于发展需要，项目在原厂区内进行扩建环保手续，具体内容如下：

- 1、增加投资额 10 万元；
- 2、增加研磨机 3 台、脱水机 2 台；

项目扩建后总投资 40 万元，占地面积 100m²，建筑面积 100m²，加工生产五金件零配件 3600 万个/年年。项目在原厂区内扩建，此次仅增加研磨、脱水工艺。

因新建项目未进行验收监测，所以此次验收对新建项目和扩建项目进行验收。

受建设单位东莞市虎门龙顺莹利五金加工店委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 10 月 29 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，于 2019 年 10 月 31 日~11 月 1 日对其废气、噪声治理项目进行了验收监测。


2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 中华人民共和国国务院令 第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令 第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年 第 9 号；
- (5) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函〔2017〕1945 号；
- (6) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日第二次修正）；
- (7) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (8) 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》，2019 年 06 月；
- (9) 东莞市新腾环保科技有限公司，《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》，2019 年 10 月；
- (10) 东莞市生态环境局，关于《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕12062 号，2019 年 7 月 17 日；
- (11) 东莞市生态环境局，关于《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕21830 号，2019 年 10 月 28 日；
- (12) 东莞市虎门龙顺莹利五金加工店与验收相关的其他资料。

3 工程建设情况

3.1 平面布置

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店位于广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷 4 号 301 室，厂区平面布置及监测点位图见图 3-1。

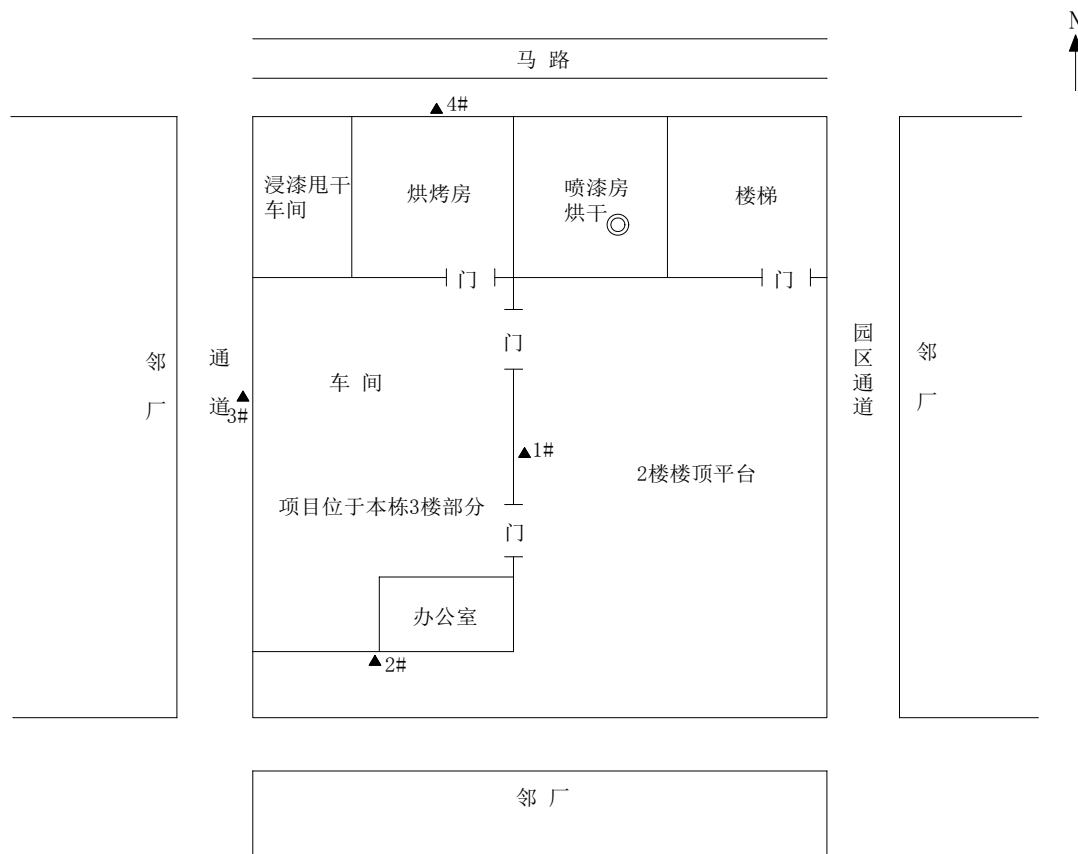

注：◎喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气排放口，▲噪声监测点

图 3-1 厂区平面布置及监测点位

3.2 建设内容

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店位于广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷 4 号 301 室。

新建项目《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 7 月 17 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建（2019）12062 号，项目主要加工生产五金零配件 3600 万个/年。项目总投资 30 万元，其中环保投资 6.5 万元，占地面积 100 平方米，建筑面积 100 平方米。

扩建项目《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于2019年10月28日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕21830号，现由于发展需要，项目在原厂区内进行扩建环保手续，具体内容如下：

- 1、增加投资额10万元；
- 2、增加研磨机3台、脱水机2台；

项目扩建后总投资40万元，占地面积100m²，建筑面积100m²，加工生产五金件零配件3600万个/年年。项目在原厂区内扩建，此次仅增加研磨、脱水工艺。

项目员工人数 10 人，全年工作 300 天，每天工作时间 8 小时，均不在项目内食宿。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表

序号	生产设备	环评数量	实际验收数量	是否与环评一致	备注
1	水帘柜	1 台	1 台	相符	--
2	喷枪	2 支	2 支	相符	--
3	电烤箱	3 台	3 台	相符	--
4	浸泡桶	1 个	1 个	相符	--
5	甩干机	1 台	1 台	相符	--
6	空压机	1 台	1 台	相符	--
7	研磨机	3 台	3 台	相符	--
8	脱水机	2 台	2 台	相符	--

3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	扩建前	扩建后	变化部分
1	五金零配件半成品	3600 万个/年	3600 万个/年	0
2	水性油漆	0.7 吨/年	0.7 吨/年	0
3	光亮剂	0	0.03 吨/年	+0.03 吨/年
4	磨石	0	0.05 吨/年	+0.05 吨/年

3.4 生产工艺

1、新建项目五金零配件生产工艺流程图及产污环节：

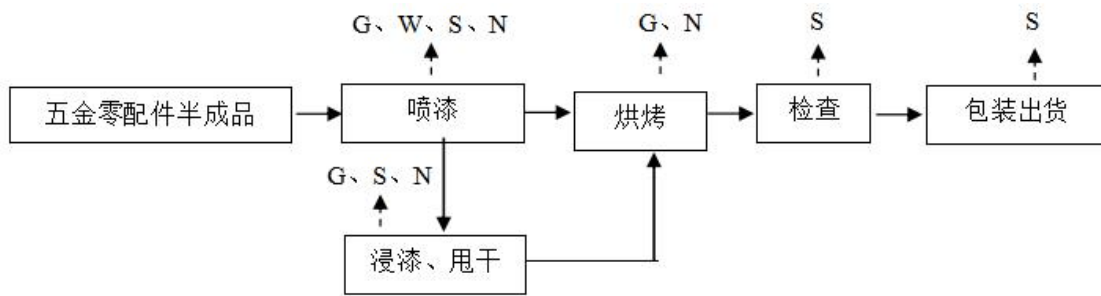


图 3-2 新建项目五金零配件生产工艺及产污环节图

(说明：S 为固体废物；N 为噪声；G 为废气；W 为废水。)

新建生产工艺流程简述：

喷漆：五金零配件半成品在水帘柜中使用喷枪在其表面喷上水性油漆，以起到美观及保护的目。喷枪用完后使用抹布蘸自来水进行清洁，该工序产生少量有机废气（主要成分为总 VOCs）、水帘柜废水、废漆渣、废油漆罐、废抹布和噪声。

浸漆、甩干：部分喷漆后的工件根据生产需要在浸泡桶内进行浸漆，然后经甩干机进行甩干工件表面的多余油漆，甩出来的油漆回用于浸漆工序。该工序产生少量有机废气（主要成分为总 VOCs）、废油漆罐和噪声。

烘烤：喷漆、浸漆后的五金零配件半成品经电烤箱烘干使油漆固化，电烤箱用电，不会产生燃料燃烧废气。该工序产生少量有机废气（主要成分为总 VOCs）和噪声。

检查：人工肉眼对烘烤后的成品进行外观检查，该工序产生少量次品。

包装出货：成品经人工包装后即可出货，该工序产生废包装材料。

2、扩建项目五金零配件生产工艺流程图及产污环节：

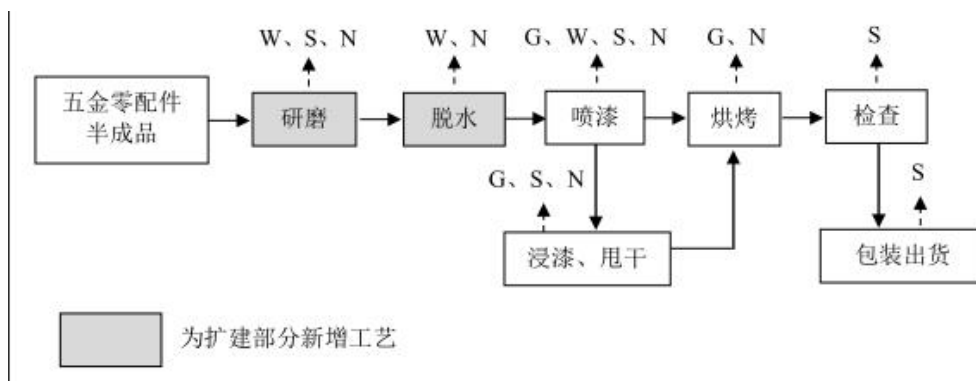


图 3-2 扩建项目五金零配件生产工艺及产污环节图

(说明: S 为固体废物; N 为噪声; G 为废气; W 为废水。)

扩建生产工艺流程简述:

研磨: 将外购回厂的五金零配件半成品放进研磨机中添加少量光亮剂、自来水和磨石进行研磨, 使工件表面变得光亮, 该工序产生研磨废水、废光亮剂罐和噪声。

脱水: 使用脱水机将研磨后的工件表面水分脱除, 该工序产生研磨废水和噪声。

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表(表 3-1)可知, 该项目无重大变化。

4 环境保护设施

4.1 污染治理/处置设施

4.1.1 废气

该新建项目生产过程中产生的大气污染物主要为喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气。(注: 扩建项目无新增废气。)

喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气: 项目喷漆、浸漆、甩干工序使用水性油漆过程及工件烘烤中会挥发产生少量有机废气, 主要成分为总 VOCs。喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气经收集水处理+UV 光解+活性炭处理后, 通过 15 米排气筒高空排放。

4.1.2 噪声

项目噪声主要来自机械设备运行时产生的噪声。

该项目通过选用低噪设备, 合理布局噪声源, 采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声。

4.1.3 固（液）体废物

该项目产生的固体废物主要包括生活垃圾，一般工业固体废物和危险废物。

- 1、生活垃圾：项目员工生活垃圾产生量为 1.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。
- 2、一般工业固体废物：项目生产过程中产生次品、废包装材料，年产生量为 0.3t/a，收集后交专业公司回收处理。
- 3、危险废物：项目喷漆过程中产生的废漆渣产生量为 0.05t/a；清洁喷枪过程中产生少量的废抹布产生量为 0.02t/a；有机废气治理过程中使用的活性炭，吸附一段时间后饱和，需进行更换产生的废活性炭产生量为 0.3t/a；油漆使用过程产生的废油漆罐，产生量为 0.05t/a，废光亮剂罐产生量为 0.005t/a，经收集后交有资质单位处理。

综上所述，污染防治措施及“三同时”落实情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排放方式 及去向	相符性
废气	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气	总 VOCs	将喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序设置在密闭车间并设置集气装置对其产生的有机废气进行收集后经“水喷淋+UV 光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放	水处理+UV 光解+活性炭处理	通过 15 米排气筒高空排放	与环评及批复要求一致
噪声	生产设备	噪声	选用低噪设备，合理布局噪声源，采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声	选用低噪设备，合理布局噪声源，采取距离衰减、隔声、消声、减震等综合治理措施来降低噪声	/	与环评及批复要求一致
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	交由环卫部门统一清运处理	交由环卫部门统一清运处理	交由环卫部门统一清运处理	与环评及批复要求一致
	一般工业固体废物	次品、废包装材料	交专业回收公司回收处理	交专业回收公司回收处理	交专业回收公司回收处理	与环评及批复要求一致
	危险废物	废油漆罐、废漆渣、废抹布和废活性炭、废光亮剂罐	交给有资质单位处理	交给有资质单位处理	交给有资质单位处理	与环评及批复要求一致

5 建设项目环评报告表审批部门审批决定

东莞市生态环境局关于《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕12062号，2019年7月17日，东莞市生态环境局关于《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕21830号，2019年10月28日，详见附件3。

6 验收执行标准

6.1 废气验收执行标准

喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第II时段排放限值。

具体见表6-1。

表 6-1 废气排放执行标准限值

验收项目	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率(kg/h)	无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)	排气筒高度 (m)
喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气	总 VOCs	30	2.9	--	15

6.2 噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。厂界噪声执行标准见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	3类	65

7 验收监测内容

具体监测内容见表 7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气处理前、排放口各设 1 个点	总 VOCs	连续监测 2 天，每天分时段监测 3 次。	--
厂界噪声	厂界外东 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天，每天昼间监测 1 次。	--
	厂界外南 1m 处			
	厂界外西 1m 处			
	厂界外北 1m 处			

8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表 8-1。

表 8-1 监测分析及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
废气	总 VOCs	气相色谱法 DB 44/815-2010 附录 D	气相色谱仪 GC9800	0.01mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	多功能声级计 AWA5688	28~133dB (A)

8.2 人员资质

此次验收参与监测人员：李一民、卢嘉阳、吴波、黄浩霖、刘日升、王耀炜、夏健宇，人员上岗证见附件1。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 所有监测仪器均在检定/校准周期内。
- (3) 废气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。在测试时保证其采样流量的准确。大气采样器校准记录见表8-2。

表 8-2 大气采样器校准记录

监测日期	仪器型号	示值流量 (L/min)	校准仪测量 结果(L/min)	示值误差 (%)	允许示值误差 范围(%)	达标 情况
2019.10.31	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.501	-0.2	±5	达标
2019.11.01	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.448	0.4	±5	达标

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的代表性和可比性。
- (2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB。声级计校准记录一览表见表8-3。

表 8-3 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准 值 dB (A)	仪器示值		示值偏 差 dB	测量前 后允许 示值偏 差范围 dB	达标 情况	
2019. 10.31	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	94.0	0	±0.5	达标
					测量后	93.8	-0.2	±0.5	达标
2019. 11.01	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	93.9	-0.1	±0.5	达标
					测量后	94.1	0.1	±0.5	达标

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

采样日期	采样次数	天气状况	气温 (°C)	相对湿度 (%)	大气压强 (kPa)	最大风速 (m/s)	风向
2019.10.31	第一次	晴	30.8	41	101.6	2.8	西风
	第二次	晴	28.9	39	101.6	3.0	西风
	第三次	晴	27.6	44	101.5	2.9	西风
2019.11.01	第一次	晴	26.8	54	101.8	3.1	西风
	第二次	晴	27.9	52	101.7	2.6	西风
	第三次	晴	29.3	47	101.7	2.4	西风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计年产量	正常生产日产量	2019.10.31		2019.11.01		备注
			监测期间产量	生产负荷	监测期间产量	生产负荷	
五金零配件	3600 万个	12 万个	10 万个	83.3%	10 万个	83.3%	--

9.3 环境保护设施调试效果

9.3.1 污染物排放监测结果

9.3.1.1 废气

表 9-4 喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气监测结果

监 测 项 目 及 结 果										
治理措施：水处理+UV 光解+活性炭										
监测时间	监测点位	监测项目		监测结果			平均值	处理效率 (%)	标准值	结果评价
				第一次	第二次	第三次				
2019.10.31	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	60.8	74.2	61.9	65.6	--	--	--
		排气筒高度 (m)		--				--	--	--
		标况干废气量 (m ³ /h)		2171	2365	2268	2268	--	--	--
		流速 (m/s)		6.7	7.3	7.0	7.0	--	--	--
	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气排放口	总 VOCs	排放浓度(mg/m ³)	12.2	13.3	16.9	14.1	78.5	30	达标
			排放速率(kg/h)	24×10 ²	30×10 ²	35×10 ²	30×10 ²		2.9	达标
		排气筒高度 (m)		15				--	--	--
		标况干废气量 (m ³ /h)		2003	2232	2061	2099	--	--	--
		流速 (m/s)		3.5	3.9	3.6	3.7	--	--	--
								--	--	--
2019.11.01	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	74.1	80.5	101	85.2	--	--	--
		排气筒高度 (m)		--				--	--	--
		标况干废气量 (m ³ /h)		2624	2527	2819	2657	--	--	--
		流速 (m/s)		8.1	7.8	8.7	8.2	--	--	--
	喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气排放口	总 VOCs	排放浓度(mg/m ³)	25.5	15.6	13.4	18.2	78.6	30	达标
			排放速率(kg/h)	6.1×10 ²	3.5×10 ²	3.5×10 ²	4.4×10 ²		2.9	达标
		排气筒高度 (m)		15				--	--	--
		标况干废气量 (m ³ /h)		2404	2232	2633	2423	--	--	--
		流速 (m/s)		4.2	3.9	4.6	4.2	--	--	--
								--	--	--
注：1、执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时段排放限值； 2、本结果只对当时采集的样品负责。										

9.3.1.2 厂界噪声

表 9-5 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单 位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	结果评价
			昼间	昼间	
1#	厂界外东 1m 处	2019.10.31	61.4	65	达标
		2019.11.01	62.3	65	达标
2#	厂界外南 1m 处	2019.10.31	58.7	65	达标
		2019.11.01	59.9	65	达标
3#	厂界外西 1m 处	2019.10.31	60.9	65	达标
		2019.11.01	61.2	65	达标
4#	厂界外北 1m 处	2019.10.31	62.6	65	达标
		2019.11.01	62.8	65	达标

注：1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准；
2、由于企业夜间不进行生产（企业已出具相关证明），故夜间噪声不进行监测；
3、本结果只对当时监测结果负责。

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》由东莞市新腾环保科技有限公司编制，并于 2019 年 7 月 17 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建〔2019〕12062 号，东莞市生态环境局关于《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建〔2019〕21830 号，2019 年 10 月 28 日。

11 验收监测结论

11.1 废气

喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序废气中总 VOCs 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排放限值。

11.2 噪声

厂界东、南、西、北面昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

11.3 固体废弃物

该项目员工生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生次品、废包装材料收集后交专业公司回收处理；废油漆罐、废漆渣、废光亮剂罐、废抹布和废活性炭经收集后交有资质单位处理。

11.4 建议

- (1) 加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账，确保废气污染源治理长期稳定达标排放；
- (2) 加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；
- (3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；
- (4) 加强固体废弃物的规范化管理，按要求完善各污染物的标志。

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	东莞市虎门龙顺莹利五金加工店新建、扩建项目				项目代码	无		建设地点	广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷4号301室				
	行业类别(分类管理名录)	二十二、67_金属制品加工制造				建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 后环评							
	设计生产能力	五金零配件 3600 万个/年				实际生产能力	五金零配件 3600 万个/年		环评单位	东莞市新腾环保科技有限公司				
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局				审批文号	东环建〔2019〕12062号		环评文件类型	环境影响报告表				
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--				
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--				
	验收单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	--		验收时监测工况	83.3%				
	投资总概算(万元)	30(新建)、10(扩建)				环保投资总概算(万元)	6.5(新建)、0.5(扩建)		所占比例(%)	21.7(新建)、5(扩建)				
	实际总投资(万元)	30(新建)、10(扩建)				实际环保投资(万元)	6.5(新建)、0.5(扩建)		所占比例(%)	21.7(新建)、5(扩建)				
	废水治理(万元)	--	废气治理(万元)	--	噪声治理(万元)	--	固体废物治理(万元)	--	绿化及生态(万元)	--				
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h					
运营单位	东莞市虎门龙顺莹利五金加工店			运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			--		验收时间	2019年10月31日~11月01日				
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	总 VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	SO ₂	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	NO _x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
与项目有关的其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9) = (4)-(5)-(8) - (11) + (1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 监测人员上岗证

<p style="text-align: center;">说 明</p> <p>一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。</p> <p>二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。</p> <p>三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。</p> <p>四、此证不得转借、涂改无效。</p> <p>五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。</p>	<p style="text-align: center;">校准/检验检测能力证 粤R 字第023号</p> <p>姓 名 <u>卢嘉阳</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1987.02</u></p> <p>文化程度 <u>大专</u> 职称 <u>/</u></p> <p>工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u></p> <p>发证单位：广东计量协会</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">说 明</p> <p>一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。</p> <p>二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。</p> <p>三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。</p> <p>四、此证不得转借、涂改无效。</p> <p>五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。</p>	<p style="text-align: center;">校准/检验检测能力证 粤R 字第6025号</p> <p>姓 名 <u>夏健宇</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1984.10</u></p> <p>文化程度 <u>大专</u> 职称 <u>/</u></p> <p>工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u></p> <p>发证单位：广东计量协会</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说 明

一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。


二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。

三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

四、此证不得转借、涂改无效。

五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。

校准/检验检测能力证 **粤R** 字第**3780**号

姓 名 刘日升 

性 别 男

出生年月 1990.09

文化程度 本科 职称 /

工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司

发证单位：广东计量协会

说 明

一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。


二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。

三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。

四、此证不得转借、涂改无效。

五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。

校准/检验检测能力证 **粤R** 字第**6028**号

姓 名 王耀炜 

性 别 男


出生年月 1993.02

文化程度 大专 职称 /

工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司

发证单位：广东计量协会

附件 2 采样照片

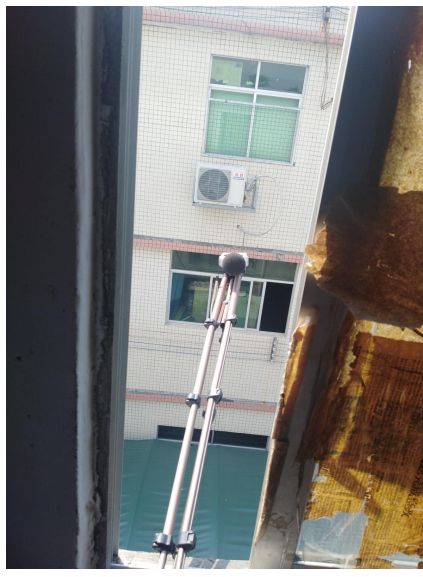

附件 3 审批部门审批决定

新建项目

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕12062 号

关于东莞市虎门龙顺莹利五金加工店 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店：

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、东莞市虎门龙顺莹利五金加工店在广东省东莞市虎门镇南栅文明路六巷 4 号 301 室（与营业执照地址相符，北纬 22°47'10.81"，东经 113°40'43.12"）建设。项目占地面积 100 平方米、建筑面积 100 平方米，年加工生产五金零配件 3600 万个。主要设备为水帘柜 1 台、电烤箱 3 台、甩干机 1 台等（详见该建设项目环境影响报告表）。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目环境保护要求：

（一）不允许排放生产性废水。水帘柜废水（10.125t/a）、水喷淋废水（2t/a）须经固定的收集设施收集后交给有资质的单

位处理。

(二) 生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入市政截污管网, 引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

(三) 喷漆、浸漆、甩干、烘烤工序设置在密闭车间内, 产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放, 废气排放执行广东省《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第II时段排气筒排放限值。

(四) 做好设备的消声降噪措施, 噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

(五) 按照分类收集和综合利用的原则, 妥善处理处置各类固体废物, 防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定, 交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求, 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口, 安装主要污染物在线监控系统, 按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,按规定对配套建设的环境保护设施进行验收,验收合格后,项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的,应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规,涉及其它须许可的事项,取得许可后方可建设。



扩建项目:

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕21830 号

关于东莞市虎门龙顺莹利五金加工店（扩建） 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市虎门龙顺莹利五金加工店:

你单位委托东莞市新腾环保科技有限公司编制的《东莞市虎门龙顺莹利五金加工店建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下:

一、东莞市虎门龙顺莹利五金加工店在东莞市虎门镇南栅文明路六巷4号3栋301室（与营业执照地址相符，北纬22°47'10.81"，东经113°40'43.12"）扩建。项目占地面积100平方米、建筑面积100平方米，年加工生产五金零配件3600万个。主要设备为甩干机1台、研磨机3台、脱水机2台等（详见该建设项目环境影响报告表）。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目扩建部分环境保护要求:

（一）不允许排放生产性废水。研磨废水（7.29t/a）须经固

定的收集设施收集后交给有资质的单位处理。

(二) 生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入市政截污管网, 引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

(三) 做好设备的消声降噪措施, 噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 妥善处理处置各类固体废物, 防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定, 交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求, 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口, 安装主要污染物在线监控系统, 按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后, 按规定对配套建设的环境保护设施进行验收, 验收合格后, 项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的,应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规,涉及其它须许可的事项,取得许可后方可建设。


东莞市生态环境局
2019年10月28日

附件 4 验收监测委托书

验收监测委托书

东莞市华溯检测技术有限公司：

现我 东莞顺堂利五金加工厂 委托贵公司承担
我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准
和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位（盖章）：_____



日期： 2019 年 9 月 2 日

附件 5 夜间不生产证明

证 明

兹有我 广东东莞市顺荣五金加工厂，地址
 位于 广东省东莞市黄江镇南太A文明路之益隆3号，主要
 从事 加工五金零件。为防
 止噪声扰民等现象的发生，我司保证在每天晚上 22:00 到次日
 6:00 期间不进行生产作业。

特此证明！



企业名称 (盖章): _____

2019 年 9 月 27 日
