

东莞市君锐五金制品有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20190827002

项目名称：东莞市君锐五金制品有限公司建设项目

建设单位：东莞市君锐五金制品有限公司



东莞市华溯检测技术有限公司

二〇一九年八月

编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20190827006）检测报告。

建 设 单 位：东莞市君锐五金制品有限公司

法 人 代 表：张田菊

编 制 单 位：东莞市华溯检测技术有限公司

法 人 代 表：何春桥

项 目 负 责 人：庄佳喜

报 告 编 写 人：刘 冰

复 核：张宏煜

审 核：卢智慧

签 发：郑世琪

签 发 日 期：2019 年 08 月 27 日

建设单位：东莞市君锐五金制品有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13825752349

电话：0769-27285578

传真：——

传真：0769-23116852

邮编：——

邮编：523129

地址：东莞市虎门镇居岐社区大坑路 8 号 A 栋三楼

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	1
3 工程建设情况.....	2
3.1 地理位置及平面布置.....	2
3.2 建设内容.....	3
3.3 主要原辅材料.....	4
3.4 生产工艺.....	4
3.5 项目变动情况.....	5
4 环境保护设施.....	5
4.1 污染治理/处置设施.....	5
4.1.1 废气.....	5
4.1.2 噪声.....	6
4.1.3 固（液）体废物.....	6
5 建设项目环评报告表审批部门审批决定.....	7
6 验收执行标准.....	7
6.1 废气验收执行标准.....	7
6.2 噪声验收执行标准.....	7
7 验收监测内容.....	8
8 质量保证及质量控制.....	8
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	8
8.2 人员资质.....	8
8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	8
8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	9
9 验收监测结果.....	10
9.1 监测期间天气情况.....	10
9.2 生产工况.....	10
9.3 环境保护设施调试效果.....	11
9.3.1 污染物排放监测结果.....	11

10 环保检查结果.....	12
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	12
10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	12
11 验收监测结论.....	12
11.1 废气.....	12
11.2 噪声.....	13
11.3 固体废弃物.....	13
11.4 建议.....	13
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	14
附件 1 监测人员上岗证.....	15
附件 2 采样照片.....	16
附件 3 审批部门审批决定.....	17
附件 4 验收监测委托书.....	20

1 验收项目概况

东莞市君锐五金制品有限公司位于东莞市虎门镇居岐社区大坑路 8 号 A 栋三楼（中心地理坐标：北纬 22°50'0.15"；东经：113°43'23.00"），属于新建项目。项目总投资 100 万元，其中环保投资 10 万元，占地面积 300 平方米，建筑面积 300 平方米，项目主要从事塑胶配件、五金配件的加工生产，年加工生产塑胶配件 60 万件、五金配件 120 万件。

《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》由广西圣川环保工程有限公司编制，并于 2019 年 06 月 19 日通过了东莞市生态环境局审批，批文号东环建【2019】9512 号。

受建设单位东莞市君锐五金制品有限公司委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 08 月 12 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，于 2019 年 08 月 14 日~15 日对其废气、噪声治理项目进行了验收监测。

2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日第二次修正）；
- (3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (4) 中华人民共和国国务院令 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (5) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (6) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年 第 9 号；
- (7) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函〔2017〕1945 号；
- (8) 广西圣川环保工程有限公司，《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》；
- (9) 东莞市生态环境局，关于《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建【2019】9512 号，2019 年 06 月 19 日；

(10) 东莞市君锐五金制品有限公司与验收相关的其他资料。


3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

东莞市君锐五金制品有限公司位于东莞市虎门镇居岐社区大坑路 8 号 A 栋三楼，地理位置见图 3-1，厂区平面布置及监测点位图见图 3-1。



图3-1 厂区地理位置图

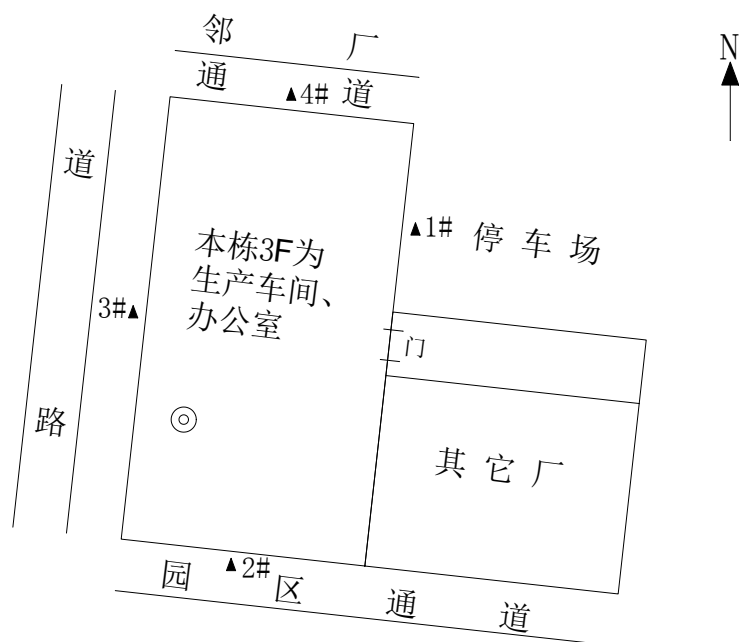

注：◎烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气排放口；▲噪声监测点

图 3-1 厂区平面布置及监测点位

3.2 建设内容

东莞市君锐五金制品有限公司位于东莞市虎门镇居岐社区大坑路 8 号 A 栋三楼。项目总投资 100 万元，其中环保投资 10 万元，占地面积 300 平方米，建筑面积 300 平方米，项目主要从事塑胶配件、五金配件的加工生产，年加工生产塑胶配件 60 万件、五金配件 120 万件。

项目年工作 300 天，每天工作 8 小时，员工人数 10 人，均不在项目内食宿。

环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表

序号	设备名称		环评数量	实际数量	是否与环评一致	规格型号	工序
1	手动水帘柜		4 个	4 个	相符	尺寸均为 1.5m*1.2m*2m, 水深 0.2m	喷漆、烤漆
2	配套	往复机	1 台	1 台	相符	/	
3		喷枪	4 把	4 把	相符	/	
4		电烤箱	5 台	5 台	相符	/	
5		自动喷漆线	1 条	1 条	相符	/	
6	配套	水帘柜	1 个	1 个	相符	尺寸为 3.5m*2.5m*2m, 水深 0.2m	
7		喷枪	5 把	5 把	相符	/	
8		隧道炉	1 条	1 条	相符	用电	
9	喷粉柜		2 个	2 个	相符	/	喷粉
10	配套	喷枪	2 把	2 把	相符	/	烤粉
11	烤粉箱		2 台	2 台	相符	用电	
12	超声波清洗机		1 台	1 台	相符	水槽尺寸: 0.8m*0.6m*0.5m	超声波清洗
13	风干机		2 台	2 台	相符	/	风干
14	空压机		1 台	1 台	相符	/	辅助设备

3.3 主要原辅材料


项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	材料名称	用量	备注
1	塑胶配件半成品	60 万件/年	/
2	五金配件半成品	120 万件/年	/
3	环氧树脂粉	0.3 吨/年	/
4	水性油漆	0.5 吨/年	/

3.4 生产工艺

项目生产工艺流程及产污环节：

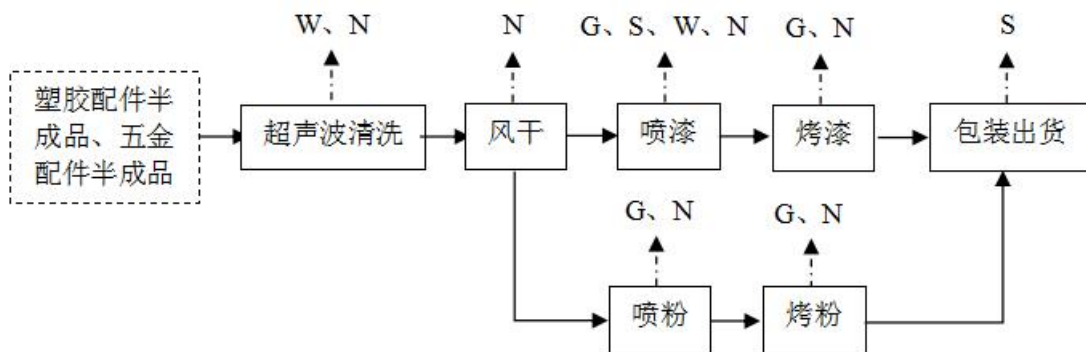

说明：S为固体废物； N为噪声； G为废气； W为废水。

工艺流程说明:

超声波清洗: 外购回厂的塑胶配件半成品、五金配件半成品放入超声波清洗机中添加普通自来水(不添加任何清洗剂)进行清洗。

风干: 使用风干机将工件表面水分进行风干。

喷漆: 根据生产需要, 在水帘柜中使用喷枪在部分塑胶配件半成品、五金配件半成品表面喷上水性油漆, 以起到美观及保护的目, 喷枪用完后使用抹布蘸自来水进行清洁。

烤漆: 使用电烤箱将油漆进行烘干。

喷粉: 根据生产需要, 使用喷枪在部分塑胶配件半成品、五金配件半成品表面喷上环氧树脂粉, 在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负极, 被喷涂工件接地形成正极, 使喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气, 将粉末涂料从供粉桶经粉管送到喷枪的喷杯和极针时, 由于它接上高压负极产生的电晕放电, 在其附近产生了密集负电荷, 使粉末带上负电荷, 进入了电场强度很高的静电场, 在静电力和运载气体推动力的双重作用下, 粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层。

烤粉: 喷粉后的工件经烤粉箱进行加热固化转化为耐久的涂膜, 烤粉箱用电。

包装出货: 成品经人工包装后即可出货。

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段生产设备与实际生产设备对比一览表(表 3-1)可知, 该项目无重大变动情况。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

该项目生产过程中产生的大气污染物主要为喷粉工序废气、烤粉、烤漆、喷漆工序废气。

项目喷粉工序废气主要为环氧树脂粉喷涂过程中未喷上的粉末污染, 主要污染物为颗粒物。项目喷粉后的工件需在烤粉箱中进行烘烤固化会产生少量有机废气, 主要污染为总 VOCs。喷漆工序使用水性油漆过程及工件烘烤中会挥发产生少量有机废气, 主要污染为总 VOCs。项目将烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气收集统一经水喷淋+UV 光解+活性炭处理后通过 17 米排气筒高空排放。

4.1.2 噪声

项目噪声主要来自普通加工机械、通风设备、辅助设备运行时产生的噪声。该项目通过选用低噪设备，合理布局噪声源，采取距离衰减、隔声、消声，加强绿化等综合治理措施来降低噪声。

4.1.3 固（液）体废物

该项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

1、生活垃圾：产生量约 1.5t/a，交由环卫部门统一清运处理。

2、一般固体废物：项目生产过程中产生的废包装材料产量约 0.1t/a，交专业公司回收处理。

3、危险废物：项目喷漆过程中产生的废漆渣产生量为 0.05t/a；清洁喷枪过程中产生少量的废抹布产生量为 0.02t/a；废气治理过程中使用的活性炭，吸附一段时间后饱和，需进行更换产生的废活性炭，产生量为 0.4t/a，油漆使用过程产生的废油漆罐产生量为 0.03t/a。废油漆罐、废漆渣、废抹布和废活性炭均交由有资质单位处理。

综上所述，污染防治措施及“三同时”落实情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物 名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排 放方式及 去向	相符性
废气	喷粉工 序	颗粒物	设置集气装置进行收集后高空排放（排气筒高度不低于 15m）	水喷淋+UV 光解+活性炭	通过 17 米 排气筒高 空排放	达标排放
	烤粉、喷 漆、烤漆 工序	总 VOCs	设置在密闭车间内，并对其产生的有机废气进行收集经“水喷淋+UV 光解催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后由排气筒引至高空排放（排气筒高度不低于 15m）			达标排放
噪声	机械设 备、通风 设备、辅 助设备	噪声	采取适当隔音、降噪措施	选用低噪设 备，采取隔声、 消声，加强绿 化等	/	与环评及批 复要求一致
固体废物	生活垃 圾	生活垃圾	交环卫部门统一处理	交环卫部门统 一处理	环卫部门 统一处理	与环评及批 复要求一致
	一般固 体废物	废包装材料	交专业公司回收处理	交专业公司回 收处理	专业公司 回收处理	与环评及批 复要求一致
	危险废 物	废油漆罐、废 漆渣、废抹布、 废活性炭	交有资质单位处理	交有资质单位 处理	有资质单 位处理	与环评及批 复要求一致

5 建设项目环评报告表审批部门审批决定

东莞市生态环境局关于《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》的批复，批文号东环建【2019】9512号，2019年06月19日，详见附件3。

6 验收执行标准

6.1 废气验收执行标准

1. 烤粉、烤漆、喷漆工序废气执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排放限值。

2. 喷粉工序废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二段二级标准。

具体见表6-1。

表 6-1 废气排放执行标准限值

验收项目	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	排气筒高度 (m)
烤粉、喷粉、烤漆、 喷漆工序废气	总 VOCs	30	2.9	17
	颗粒物	120	3.7	

6.2 噪声验收执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。厂界噪声执行标准见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	3类	65

7 验收监测内容

具体监测内容见表 7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
烤粉、喷粉、烤漆、 喷漆工序废气	烤粉、喷粉、烤漆、喷漆 工序废气处理前设 1 个点	总 VOCs	连续监测 2 天, 每天 分时段监测 3 次。	--
	烤粉、喷粉、烤漆、喷漆 工序废气排放口设 1 个点	总 VOCs、颗粒物	连续监测 2 天, 每天 分时段监测 3 次。	--
厂界噪声	厂界外东 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天, 每天 昼间监测 1 次。	--
	厂界外南 1m 处			
	厂界外西 1m 处			
	厂界外北 1m 处			

8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行, 见表 8-1。

表 8-1 监测分析及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
废气	总 VOCs	气相色谱法 DB 44/814-2010 附录 D	气相色谱仪 GC9800	0.01mg/m ³
	颗粒物	重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气综合测试 仪 ZR-3260	1.0 mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排 放标准》GB12348-2008	多功能声级计 AWA5688	28~133dB (A)

8.2 人员资质

此次验收参与监测人员: 罗朝阳、黄浩霖、俞昌柯、郑景林、苏建钟、刘日升、王耀炜、卢飞、常风玲、夏健宇、曾繁辉、吴志雄, 人员上岗证见附件1。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 所有监测仪器均在检定/校准周期内。
- (3) 废气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定), 大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。在

测试时保证其采样流量的准确。大气采样器校准记录一览表及全程序空白测试结果见下表。

表 8-2 大气采样器校准记录一览表

监测日期	仪器型号	示值流量 (L/min)	校准仪测量结果(L/min)	示值误差 (%)	允许示值误差范围(%)	达标情况
2019.08.14	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.499	0.2	±5	达标
2019.08.15	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.501	-0.2	±5	达标

表 8-2 大气采样器校准记录一览表 (续)

监测日期	仪器型号	瞬时流量示值 (L/min)	校准仪测量结果(L/min)	满量程值 (L/min)	示值误差 (%)	允许示值误差范围 (%)	达标情况
2019.08.14	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	20.0	20.1	80	-0.13	±5	达标
2019.08.15	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	20.0	19.9	80	0.13	±5	达标

表8-3 大气采样器全程序空白测试结果

监测日期	采样头初始恒重 (g)	现场空白采样头恒重 (g)	采样头增量 (g)	允许增量范围(mg)	达标情况
2019.08.14	17.84236	17.84248	0.00012	±0.5	达标
2019.08.15	17.64330	17.64340	0.00010	±0.5	达标

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的代表性和可比性。
- (2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB。声级计校准记录一览表见表8-4。

表 8-4 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准值 dB (A)	仪器示值 dB (A)		示值偏差 dB	测量前后允许示值偏差范围 dB	达标情况	
2019.08.14	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	94.1	0.1	±0.5	达标
					测量后	94.0	0	±0.5	达标
2019.08.15	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	93.8	-0.2	±0.5	达标
					测量后	94.0	0	±0.5	达标

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

采样日期	采样次数	天气状况	气温(℃)	相对湿度(%)	大气压强(kPa)	最大风速(m/s)	风向
2019.08.14	第一次	晴	23.5	70	99.4	2.5	东风
	第二次	晴	32.1	68	99.6	2.6	东风
	第三次	晴	30.2	66	99.5	2.3	东风
2019.08.15	第一次	晴	24.8	70	99.3	2.6	东风
	第二次	晴	32.4	67	99.7	2.8	东风
	第三次	晴	31.1	68	99.4	2.4	东风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产品产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计年产量	正常生产日产量	2019.08.14		2019.08.15		备注
			监测期间产量	生产负荷	监测期间产量	生产负荷	
塑胶配件	60 万件	2000 件	1600 件	80.0%	1700	85.0%	--
五金配件	120 万件	4000 件	3200 件	80.0%	3400	85.0%	--

9.3 环境保护设施调试效果

9.3.1 污染物排放监测结果

9.3.1.1 废气

表 9-3 烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气监测结果

监测项目及结果											
治理措施：水喷淋+UV 光解+活性炭											
监测时间	监测点位	监测项目		监测结果			平均值	处理效率 (%)	标准值	达标情况	
				第一次	第二次	第三次					
2019.08.14	烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	10.6	9.27	9.15	9.67	--	--	--	
		排气筒高度 (m)		--			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		18396	17766	19026	18396	--	--	--	
		流速 (m/s)		14.6	14.1	15.1	14.6	--	--	--	
	烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气排放口	总 VOCs	排放浓度(mg/m ³)	2.93	2.44	2.27	2.55	72.4	30	达标	
			排放速率(kg/h)	5.7×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	4.5×10 ⁻²	4.9×10 ⁻²		2.9	达标	
		颗粒物	排放浓度(mg/m ³)	5.6	6.3	5.8	5.9	--	120	达标	
			排放速率(kg/h)	0.11	0.12	0.11	0.11		3.7	达标	
		排气筒高度 (m)		17			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		19598	18545	19672	19272	--	--	--	
	流速 (m/s)		32.8	31.1	33.1	32.3	--	--	--		
	2019.08.15	烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气处理前	总 VOCs	浓度(mg/m ³)	10.1	9.81	8.97	9.63	--	--	--
			排气筒高度 (m)		--			--	--	--	
			标况干废气量 (m ³ /h)		18522	19278	18018	18606	--	--	--
流速 (m/s)			14.7	15.3	14.3	14.8	--	--	--		
烤粉、喷粉、烤漆、喷漆工序废气排放口		总 VOCs	排放浓度(mg/m ³)	2.61	2.56	2.13	2.43	73.6	30	达标	
			排放速率(kg/h)	5.0×10 ⁻²	5.1×10 ⁻²	4.1×10 ⁻²	4.7×10 ⁻²		2.9	达标	
		颗粒物	排放浓度(mg/m ³)	5.7	4.8	5.5	5.3	--	120	达标	
			排放速率(kg/h)	0.11	9.6×10 ⁻²	0.11	0.10		3.7	达标	
		排气筒高度 (m)		17			--	--	--		
		标况干废气量 (m ³ /h)		19241	20087	19097	19475	--	--	--	
流速 (m/s)		32.3	33.8	32.2	32.8	--	--	--			
注：1、总 VOCs 执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排放限值，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准；											
2、本结果只对当时采集的样品负责。											

9.3.1.2 厂界噪声

表 9-4 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单 位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	达标情况
			昼间	昼间	
1#	厂界外东 1m 处	2019.08.14	63.7	65	达标
		2019.08.15	63.3	65	达标
2#	厂界外南 1m 处	2019.08.14	64.1	65	达标
		2019.08.15	63.6	65	达标
3#	厂界外西 1m 处	2019.08.14	62.9	65	达标
		2019.08.15	63.8	65	达标
4#	厂界外北 1m 处	2019.08.14	63.2	65	达标
		2019.08.15	62.5	65	达标

注: 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准;
2、本结果只对当时监测结果负责。

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》由广西圣川环保工程有限公司编制,并于 2019 年 06 月 19 日通过了东莞市生态环境局审批,批文号东环建【2019】9512 号。

11 验收监测结论

11.1 废气

烤粉、烤漆、喷漆工序废气中总 VOCs 达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排放限值标准要求。

喷粉工序废气中颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准要求。

11.2 噪声

项目东、南、西、北面厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

11.3 固体废弃物

该项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

生活垃圾：交由环卫部门统一清运处理。

一般固体废物：项目生产过程中产生的废包装材料交专业公司回收处理。

危险废物：项目废油漆罐、废漆渣、废抹布和废活性炭均交由有资质单位处理。

11.4 建议

(1) 加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账，确保废气污染源治理长期稳定达标排放；

(2) 加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；

(3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；

(4) 加强固体废弃物的规范化管理，按要求完善各污染物的标志。

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	东莞市君锐五金制品有限公司建设项目				项目代码	无		建设地点	东莞市虎门镇居岐社区大坑路8号A栋三楼			
	行业类别(分类管理名录)	十八、47_塑料制品制造 二十二、67_金属制品加工制造				建设性质	■新建 □扩建 □变更						
	设计生产能力	年加工生产塑胶配件60万件、五金配件120万件				实际生产能力	年加工生产塑胶配件60万件、五金配件120万件		环评单位	广西圣川环保工程有限公司			
	环评文件审批机关	东莞市生态环境局				审批文号	东环建【2019】9512号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--			
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--			
	验收单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	--		验收时监测工况	80.0%~85.0%			
	投资总概算(万元)	100				环保投资总概算(万元)	10		所占比例(%)	10			
	实际总投资(万元)	100				实际环保投资(万元)	10		所占比例(%)	10			
	废水治理(万元)	--	废气治理(万元)	--	噪声治理(万元)	--	固体废物治理(万元)	--	绿化及生态(万元)	--			
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h				
运营单位	东莞市君锐五金制品有限公司				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			--	验收时间	2019年08月14日~15日			
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	总VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SO ₂	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NO _x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
与项目有关的其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 监测人员上岗证

说 明	校准/检验检测能力证 粤R 字第 6025 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 夏健宇
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 男
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 1984.10
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 大专 职称 /
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司
	发证单位：广东计量协会



说 明	校准/检验检测能力证 粤R 字第 430 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 曾繁辉
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 男
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 1990.05
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 大专 职称 /
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 东莞市华溯检测技术有限公司
	发证单位：广东计量协会



附件 2 采样照片



附件 3 审批部门审批决定

东莞市生态环境局

东环建〔2019〕9512 号

关于东莞市君锐五金制品有限公司 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市君锐五金制品有限公司：

你单位委托广西圣川环保工程有限公司编制的《东莞市君锐五金制品有限公司建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

一、东莞市君锐五金制品有限公司在东莞市虎门镇居岐社区大坑路 8 号 A 栋三楼(北纬 22°50'0.15", 东经 113°43'23.00")建设。项目占地面积 300 平方米、建筑面积 300 平方米，年加工生产塑胶配件 60 万件、五金配件 120 万件。主要设备为手动水帘柜 4 个、自动喷漆线 1 条、喷粉柜 2 个、烤粉箱 2 台等(详见该建设项目环境影响报告表)。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目环境保护要求：

(一) 不允许排放生产性废水。水帘柜废水(12.76t/a)、

水喷淋废水 (2t/a) 和清洗废水 (5.76t/a) 须经固定的收集设施收集后交给有资质单位处理。

(二) 生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准后排入市政截污管网, 引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

(三) 喷粉工序产生的废气经收集后高空排放, 废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准; 烤粉、喷漆、烤漆工序须设置在密闭车间内, 产生的废气经配套处理设施收集处理后高空排放, 废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值。

(四) 做好设备的消声降噪措施, 噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(五) 按照分类收集和综合利用的原则, 妥善处理处置各类固体废物, 防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定, 交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求, 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。



附件 4 验收监测委托书

验收监测委托书

东莞市华溯检测技术有限公司：

现我 东莞市锐五金制品有限公司 委托贵公司承担我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位(盖章):

日期: 2019 年 8 月 9 日

